

١- يتم اختيار مدير المشروع في مرحلة ..... :

التأسيس

التفذي

الانهاء

التقييم

٢- من خصائص المسار الوظيفي لمدير المشروع الآتي ما عدا :

شهادة ومؤهلا علمية غير أكاديمية

الحصول على دورات متخصصة

البداية بمشاريع صغيرة

شهادة خبره

٣- يتكون مجلس اختيار المشروع من الآتي ما عدا :

المديرين الوظيفيين

المديرين العام

الادارة العليا للمنظمة

الخبراء

٤- يرغب احد الخريجين في المفاضلة بين مشروعين بديلين لإقامة احدهما، فإذا كانت التكلفة المبدئية للمشروع الأول

١٠٠٠٠ ريال ويحقق دفعات نقدية ٢٠٠٠ ريال ، بينما كانت التكلفة المبدئية للمشروع الثاني ٢٠٠٠٠ ريال ويحقق دفعات نقدية

٥٠٠٠ ريال ، تكون فترة الاسترداد للمشروع الأول تساوي :

٥

٥,٥

٤

٥,٤

٥- سعر الخصم الذي تتساوي عنده القيمة الحالية للتدفقات الخارجة مع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة :

معدل العائد الداخلي

معدل العائد على الاستثمار

معدل العائد المطلوب

مؤشر الربح

٦- يقوم نموذج ..... على البيانات الوصفية غير الرقمية في عملية الاختيار المشاريع :

البقرة المقدسة

النقط الموزونة

معدل العائد الدخلي

## مؤشر الربح

٧- عملية منهجية يتم من خلالها تقييم احد أ، مجموعة من المشاريع الفردية بهدف اختيار احدها أو بعضها للتنفيذ :

اختيار المشروع

موازنة المشروع

جدولة المشروع

تنفيذ المشروع

٨- من مرتكزات عملية اختيار المشروع الآتي ما عدا :

الجدوى الاجتماعية

التطابق مع رسالة المنظمة

الجدوى الاقتصادية

التكلفة والمنفعة

٩- يعرف ..... بأنه مجموعة الافراد الذين يعملون مع مدير المشروع وتحت إدارته لإنجاز المشروع والوصول به

لإهدافه المطلوبة :

طاقم المشروع

المديرين الموظفين

مقاولي الباطن

الخبراء

١٠- تعرف فترة ..... بانها الفترة التي يمكن عندها للمشروع أن يسترد تكاليفه المدئية :

الاسترداد

التأسيس

التشغيل

الخصم

١١- اذا علمت البيانات التالية : تكلفة راس المال وسعر الخصم في المشروع ٨% . معدل الخصم

(٠,٦٨٠,٠٠,٧٣٥,٠٠,٧٩٣,٠٠,٨٥٧,٠٠,٩٢٥) علي الترتيب، والتدفق النقدي السنوي ٢٠ الف ريال لمدة خمس سنوات ومبلغ

الاستثمار ٥٠ الف ريال ، مؤشر الربحية للمشروع يساوي :

١,٥٩

٠,١٥٩

٠,٥٩

٢,٥٩

١٢- الوثيقة من خلالها نقل متطلبات العميل الى المشروع :

خطة

مقترح المشروع

موازنة

جدولة

١٣- يحقق المشروع ..... عندما يكون معدل العائد الدخلي اكبر من تكلفة الأموال :

الخسائر

الارباح

١٤- موردون ينفذون الاعمال الجزئية مقابل اجر :

مقاولي الباطن

المقاوليين الاصليين

فريق المشروع

الموردون

١٥- يقصد ب ..... عدد وقوة وتداخل المدخلات والمخرجات الخاصة بالمنظمة :

التعقيد البيئي

عدم التأكد البيئي

الديناميكية

الغنى

١٦- يتم ادارة الوقت المشروع من خلال وظيفة ..... المشروع :

جدولة

خطة

تخصيص موارد

موازنة

١٧- تشمل المفاهيم والقيم الاخلاقية اللازم توافرها في شخص مدير المشروع للحكم عليه بأه يتمتع بأخلاقيات مهنية عالية

الآتي ما عدا :

تكوين الشلة

عدم المساومة على السلامة والامان

الابتعاد عن الرشوة

الالتزام بالمواصفات

١٨- عندما تبدأ المشروعات تعتمد قراراتين على الفور منها :

تنظيم المشروع

تنظيم المنظمة

التنظيم الرسمي

نطاق السلطة

١٩- أصبحت المنظمات المعاصرة اكثر حاجة لان تدار ب :

التسويق

المشروع

الانتاج

التمويل

٢٠- يقصد بالمشروع ..... استقلال وانفصال المشروع عن بقية اقسام المنظمة الأم ويكون وحدة مستقلة ذاتياً له طاقم فني

وادارة مستقلة :

الوظيفي

الصرف

- ٢١- يخاطر مدير المشروع بمستقبله في ادارة المشروع للآتى :  
 لان نجاح او فشل المشروع يتوقف عليه  
 لا يمثل حلقة وصل بين الادارة العليا والمشروع  
 لا يمثل دوراً يذكر  
 الازدواجيه
- ٢٢- لا يوجد هيكل تنظيمى أمثل للمشروع للآتى :  
 التوجه الثقافى للمنظمة  
 ازدواجية الوظائف  
 التجانس الثقافى  
 وحدة الهدف
- ٢٣- في المصفوفة القوية تكون القوة و السلطة اكبر في يد .....  
 مدير المشروع  
 المدير الوظيفى  
 اثاره الصراعات  
 مدير المنظمة
- ٢٤- من اتجاهات البيئة المعاصرة المساهمة في نمو المنظمات المدارة بالمشروع :  
 الانتاج حسب الطلب  
 الاسواق المحلية  
 انخفاض الطلب  
 الانتاج الكبير
- ٢٥- تشهد الخطوة النهائية من خطوات اختيار المشروع ..... المشروع الذى تم اختياره :  
 تنفيذ  
 متابعة  
 تقييم  
 تأسيس
- ٢٦- تتضمن خطوات اختيار المشروع الآتى ما عدا :  
 تأسيس مجلس الجودة  
 جمع البيانات  
 تصنيف المشاريع  
 الغريلة
- ٢٧- من مراحل بناء فريق المشروع الآتى ما عدا :  
 التفكك  
 العصف  
 التشكيل  
 الانجاز
- ٢٨- تشمل معايير اختيار المشاريع الآتى ما عدا :  
 احتمالات الفشل  
 امتلاك معرفة جديدة

- ٢٩- تشمل مرحلة ..... تدريب المستخدمين :
- |         |                 |
|---------|-----------------|
| التأسيس | <u>الالتزام</u> |
| التقييم | <u>التفويض</u>  |
- ٣٠- بفرض وجود مشروع وهناك ثلاثة معايير للمقارنة اوزانها النسبية هي على الترتيب ٥٠،٣٠،٢٠،٠،٠ وتم اعطاء النقاط التالية للثلاثة على الترتيب ٣٥،٣٠،٣٥ يكون مجموع النقاط الموزونة للمشروع يساوي :
- |      |             |
|------|-------------|
| ٤٣،٥ | <u>٣٣،٥</u> |
| ٦٣،٥ | <u>٥٣،٥</u> |
- ٣١- تتضمن معايير الاختيار الشكل التنظيمى المناسب للمشروع الآتى ماعدا :
- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| ترتيب المهام الأساسية | <u>التوجه الثقافى للمنظمة</u> |
| تحديد المهام          | تعريف المشروع                 |
- ٣٢- يهتم التخطيط بعاملين اساسين منها :
- |        |                 |
|--------|-----------------|
| الماضى | <u>المستقبل</u> |
| الحاضر | الهيكل          |
- ٣٣- تحقق المنظمات المدارة بالمشروع العديد من الفوائد منها ماعدا :
- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| انخفاض التكاليف | <u>طول وقت انتهاء الانشطة</u> |
| جودة مرتفعة     | علاقات طيبة                   |
- ٣٤- يطلق عقد الالتزام على ..... المشروع :
- |        |            |
|--------|------------|
| مقترح  | <u>خطة</u> |
| موازنة | جدولة      |
- ٣٥- تعد وظيفة تنظيم المشروع الوظيفة ..... لمدير المشروع :
- |         |                |
|---------|----------------|
| الاولى  | <u>الثانية</u> |
| الرابعة | الثالثة        |
- ٣٦- تتضمن خطائص المشروع الآتى ماعدا :
- |            |                  |
|------------|------------------|
| التفرد     | <u>الروتينية</u> |
| الاعتمادية | التنافس          |
- ٣٧- تعنى وظيفة ..... كإحدى وظائف ادارة المشروع اختيار اعضاء فريق المشروع والموارد البشرية اللازمة :
- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| الرقابة على المشروع | <u>طاقم المشروع</u> |
| توجيه المشروع       | تنظيم المشروع       |
- ٣٨- في المصفوفة الضعيفة تكون القوة و السلطة اكبر في يد .....
- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| مدير المشروع | <u>المدير الوظيفى</u> |
| مدير المنظمة | اثارة الصراعات        |
- ٣٩- يتم الاحتفاظ بالخبراء في حالة المشاريع ..... من نفس النوع :
- |          |                 |
|----------|-----------------|
| المستقلة | <u>المتابعة</u> |
|----------|-----------------|

- الوظيفية المتنوعة
- ٤٠- يعود الفضل الكبير في تطور وازدهار ادارة المشروعات الى المؤسسات ..... :
- العسكرية المدنية
- الحكومية الخاصة
- ٤١- تعد ادارة المشروع ..... حل المشكلات ضمن الوقت المحدد مسبقاً وباستخدام الموارد المتاحة :
- علم وفن علم وفن
- فن موضة
- ٤٢- ان تعيين اعضاء فريق المشروع يجعلهم يشعرون بالقلق على مستقبلهم الوظيفي عند قرب نهاية المشروع مما يؤدي الى الآتى ماعدا :
- الولاء المزدوج الكسل
- ضعف الانجاز التباطؤ
- ٤٣- تتضمن مرحلة ..... تقييم الاداء والاحتفال بنجاح المشروع وانهاء وتسليم المشروع بعد اكماله :
- المناشدة الانجاز
- التطبيع التشكيل
- ٤٤- لا يجوز اجراء أى تعديل او تغيير على الخطة النهائية للمشروع بعد المراجعة والاعتماد الا باستخدام اوامر :
- التغيير الطلب
- البيع الشراء
- ٤٥- تتضمن عناصر خطة المشروع الآتى ماعدا :
- عرض تفصيلي طرق التقييم
- الاجه التعاقدية الجدولة
- ٤٦- نشأت الحاجة للتخطيط في المشاريع للأسباب التالية :
- ندرة الموارد وفرة الموارد
- الثبات البساطة
- ٤٧- يقصد ب ..... مجموعة من المفاهيم والقيم الأخلاقية اللازم توافرها في شخص مدير المشروع للحكم عليه بأنه يتمتع بأخلاقيات مهنية عالية :
- البوصلة الأخلاقية اخلاقيات المشروع
- المسئولية الاجتماعية الميثاق الاخلاقي
- ٤٨- تعمل مشاريع ..... على احداث تحسين طفيف على المنتجات القائمة وتغيير تراكمى مثل تقليل التكلفة وزيادة الجودة :
- المشتقات الاختراق
- البحث والتطوير الانطلاق
- ٤٩- تتضمن معايير اختيار المشروع الآتى ماعدا :
- الخيالية الاستطاعة

- الحوسبة  
التكلفة
- ٥٠- تسمى جملة بيان العمل في المشروع بـ ..... المشروع :
- مقترح  
خطة
- موازنة  
جدولة
- ٥١- تتضمن عناصر مقترح المشروع الآتى ما عدا :
- موازنة المشروع  
معايير قبول المشروع
- مسئوليات الموردين  
المخاطر
- ٥٢- من الامور الواجب مراعاتها عند اعداد خطة المشروع الآتى ما عدا :
- اعداد الخطة الابتدائية  
التخطيط وسيلة وليس غاية
- التوجهات المكتوبة  
التنبؤ بالمخاطر
- ٥٣- يقصد بـ ..... المشروع الطريقة التى تستخدم لضم المشروع الى البناء التنظيمي في المنظمة الام :
- تنظيم  
خطة
- جدولة  
رقابة
- ٥٤- تتضمن مرحلة ..... ولادة فكرة المشروع وعمل دراسة الجدوى واختيار المشروع :
- التأسيس  
التنفيذ
- الاجلاق  
الانهاء
- ٥٥- تشمل مزايا فترة الاسترداد الآتى :
- سهولة الاستخدام  
تجاهل القيمة الزمنية للنقود
- تراعى القيمة الزمنية  
تجاهل الدفعات
- ٥٦- توجد جوانب مهمة يجب الإهتمام بها عند التخطيط المشروع منها :
- الغاية الاساسية  
طرق التقسيم
- هيكل العمل  
الجدولة
- ٥٧- ان قيام المشروع انتاج موديل جديد من نفس نوع السيارة يعد مثالا للمشاريع .....
- منصة الانطلاق للتغيير  
الاختراق
- البحث والتطوير  
المشتقات
- ٥٨- يتم تجزئة البرنامج الى مجموعة من .....
- المشاريع  
حزم العمل
- وحدات العمل  
الانشطة
- ٥٩- يتسم المشروع بالمخاطر .....
- المرتفعة  
المتوسطة
- المنخفضة  
المنعدمة
- ٦٠- يتم تحقيق المواصفات المحددة في المشروع عن طريق :

- تخصيص الموارد  
الخطة
- الجدولة  
الموازنة
- ٦١- تعدد وظائف التخطيط المشروع والتي يحتمل ان تواجه المشروع وتعوق وصوله لأهدافه :  
التنبؤ بالمخاطر  
تجزئة هيكل العمل  
الجدولة
- ٦٢- من اهداف المشروع الآتى ما عدا :  
الطلب  
التكلفة  
الوقت  
الجودة
- ٦٣- من ادوات حل الصراع في المشاريع الآتى ما عدا :  
مقترح المشروع  
التفاوض  
عقد الامتياز  
الشراكة
- ٦٤- يتم احتساب متوسط زمن أداء النشاط بالمعادلة التالية :  
(الوقت المتفائل + ٤ \* الوقت الأكثر احتمالا + الوقت المتشائم) / ٦  
(الوقت المتفائل - ٤ \* الوقت الأكثر احتمالا + الوقت المتشائم) / ٦  
(الوقت المتفائل + ٤ \* الوقت الأكثر احتمالا + الوقت المتشائم) / ٣٦  
العائد + التكلفة
- ٦٥- تشمل خصائص فريق المشروع الناجح الآتى ما عدا :  
غموض الاهداف  
عقد التزام الفريق  
التدريب  
القدوة
- ٦٦- تتعلق المشكلات الفنية للمشروع بـ ..... :  
الوسائل التكنولوجية  
المهارات الانسانية  
الاساليب الادارية  
اتخاذ القرارات
- ٦٧- الاعتبارات الواجب مراعتها عند اعداد الموازنة الآتى :  
انواع التكاليف  
انواع المخزون  
الانتاج  
انواع العائد
- ٦٨- تتسم دورة حياة المشروع بانها ..... :  
محدودة  
معقدة  
دائمة  
طويلة
- ٦٩- يعرف ..... بأنه ملخص قصير يتضمن غايات المشروع والاسلوب الادارى والبناء التنظيمى :  
العرض العام  
الاجه التعاقدية  
المنهج العام  
اهداف المشروع
- ٧٠- طاقم يعمل في المشروع ويقوم بتنفيذ الانشطة والمهام:



العاملين بالمنظمة

فريق المشروع

مدير المشروع

المدير الوظيفي

٧١- يطلق على الصراع بين المجموعات داخل المشروع على الاهداف والصلاحيات والموارد المحدودة والمصالح الشخصية بالصراع :

الفردى

الحلفاء

الاشقاء

الخصوم

٧٢- تستخدم المنظمات ..... كأداة في الوصول الى أهدافها :

التخطيط

التنظيم

الرقابة

التوجيه

٧٣- يرغب احد الخريجين في المفاضلة بين مشروعين بديلين لإقامة احدهما، فإذا كانت التكلفة المبدئية للمشروع الأول ١٠٠٠٠٠ ريال ويحقق دفعات نقدية ٢٠٠٠٠ ريال ، بينما كانت التكلفة المبدئية للمشروع الثاني ٢٠٠٠٠٠ ريال ويحقق دفعات نقدية ٥٠٠٠٠ ريال ، باستخدام فترة الاسترداد :

قبول المشروع الأول

قبول المشروع الثاني

رفض المشروعين

قبول المشروعين

٧٤- تشمل مراحل اعداد خطة المشروع الآتى ما عدا :

اعداد الخطة الابتدائية

التوجهات المكتوبة

الخطة النهائية

اعداد الخطة المركبة

٧٥- لا يناسب التنظيم ..... المشاريع الكبيرة والضخمة والمعقدة مثل صناعة السفن والطائرات :

الصرف

الوظيفي

المصفوفى

الاستشارى

٧٦- بفرض ان التكلفة المبدئية لاحد المشروعات الاستثمارية ٥٠٠٠٠٠ ريال ويحقق صافى تدفقات نقدية على مدار ثلاث سنوات كالتالى : ٢٠٠٠٠٠، ٢٠٠٠٠٠، ٢٦٠٠٠٠ ريال فترة الاسترداد للمشروع بالسنوات تساوي :

٣,٣٨

٢,٣٨

٤,٣٨

٣

٧٧- بفرض ان وقت تنفيذ المشروع ٢٠ يوم، تباين المسار الحرج ٨,٥٢ ، القيمة المقابلة لقيمة Z المحسوبة من الجداول الاحصائية ٠,٨٥ ، فإن احتمال تنفيذ المشروع في ٢٣ يوم يساوي :

٥٠%

٨٥%

١٠٠ %

٧٥%

٧٨- يفضل اختيار المشروع الذى له ..... فترة استرداد :

أوسط

أقل

أطول

أكبر

٧٩- من سمات النشاط الآتى ما عدا :

الاعتمادية

الروتينية

التعقيد

التتابع

٨٠- من الاسباب الموجبة لعملية تسريع المشروع الآتى ما عدا :

القيام بالجدولة بطريقة صحيحة الظروف البيئية

تغيير التشريعات الحكومية طلب الزبون

٨١- تتضمن عيوب طريقة اعداد الموازنة المخصصات التقديرية الآتى :

ارتفاع نسبة الخطأ ارتفاع التكلفة

غير دقيقة خياليه

٨٢- تؤدى مشاريع ..... الى حدوث تقدم مفاجيء في المعرفة او التكنولوجيا المستخدمة لتقديم منتج جديد :

الابتكار المشتقات

البحث والتطوير الانطلاق


٨٣- يمكن حساب زمن النهاية المبكرة بالمعالة :

زمن البداية المبكرة + وقت النشاط زمن البداية المبكرة \* وقت النشاط

العائد + التكلفة

٨٤- الطريقة المستخدمة في رسم الشبكة هي طريقة .....

النشاط على السهم	معنى النشاط	النشاط على القطب
	النشاط A يبدأ قبل B، وكل منهما يسبق C	
	النشاط A و B، كليهما يجب ينتهيا قبل ان يبدأ النشاط C	
	النشاط B و C، لا يمكن البدا بهما الا بعد الانتهاء من النشاط A	

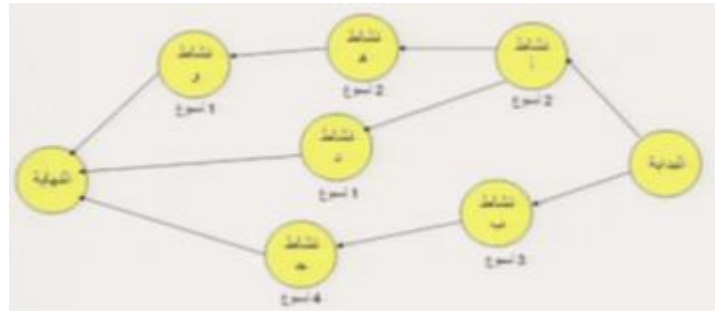

( مثال )

عند رسم النشاط على قطب فان الدوائر تعبر عن الأنشطة )

المدى


الخط المستقيم

( عند رسم النشاط على سهم تستخدم الدوائر لتدل على بداية ونهاية نشاط معين )

السهم

القطب

٨٥- احتمال الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد لتنفيذ المشروع يساوي :

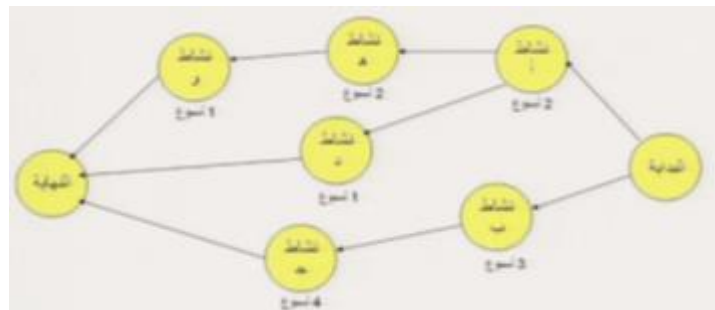


(كم أسبوع بالجدول)

١٥% (يساوي ١٠ أسابيع) ٥٠% (يساوي ١٣ أسبوع)

٢٥% (يساوي ١٢ أسبوع) ١٠٠% (يساوي ٣٠ أسبوع)

٨٦- المسار الحرج هو المسار .....

(المسار الحرج) =A-C-E-G-H →

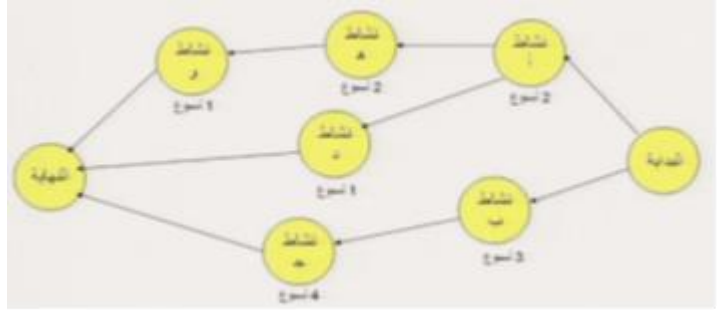

(أ - ه - و)

(ب - د - و)

(أ - د)

(ب - ج)

٨٧- تختلف المشاريع عن المنظمات الوظيفية التقليدية في :

عمق الصراع  
التأسيس  
جميع الخصائص  
الانتاج

٨٨- من اسباب الصراع في المشاريع الآتى ما عدا :

حالة التأكد  
بيئة شديدة التعقيد  
الأهداف المتعارضة  
اختلاف المصالح

٨٩- يمكن تصنيف المشاريع حسب المستوى ..... للمشروع الذى يتم تقييمه :

التكنولوجى  
الاقتصادى  
الفنى  
الاجتماعى

٩٠- يقوم مدير المشروع بالوظائف التالية ما عدا :

التعرف على العميل  
تقديم تقارير عن سير العمل  
الإشراف على المشروع  
اختيار الفريق

٩١- تشمل منافع او فوائد الجدولة الآتى ما عدا :

تزايد الصراعات  
تحديد وقت انتهاء المشروع  
تحديد الأنشطة الحرجة  
قصر الاتصال

٩٢- يطلق على تجزئة ( برنامج - مشروع - مهمة - خزمة العمل - وحدة العمل - نشاط ) مفهوم تجزئة .....

هيكل العمل  
السوق  
المشروع  
المنظمة

٩٣- يمكن تصنيف المشاريع حسب المستوى التكنولوجى والتغير فى المنتج والعملية الى الآتى ما عدا :

المغامر  
البحث والتطوير  
الاختراق  
الانطلاق

٩٤- يعرف عقد ..... بأنه اتفاقية مكتوبة بين مدير المشروع والادارة العليا للمنظمة والمديرين الوظيفين للالتزام بالشروط

استخدام الموارد اللازمة للمشروع ويتم اشراك الزبون فيها :

الالتزام  
القانونى

## التأسيس

## النفسي

٩٥- يعتبر مسار ..... هو اطول المسارات وقتنا على الشبكة وهو افضل وقت لإتمام المشروع او يساوى الوقت المتوقع لتنفيذ المشروع :

الوهمي

الخرج

الراكد

الخطي

٩٦- فى حالة عندما يسبق النشاط عدة أنشطة نحدد أوقات تنفيذ كل نشاط ونختار الوقت ..... فيهم يتم إضافته على وقت البداية لنحدد وقت النهاية :

الايوسط

الايكبر

المبكر

الايقل

٩٧- يتسم مدير المشروع بالآتى ما عدا :

يستخدم اسلوب التحليل النظامي

مدير متخصص

مدير عام

مسهل للأمور

٩٨- يحدث الصراع ..... بين الافراد او اعضاء فريق العمل بسبب غموض الادوار وسوء توزيع العمل بينهم :

الخصوم

الفردى

الاخوه

الاشقاء

٩٩- يفضل استخدام طريقة اعداد الموازنة التقديرية للمشروع ..... فى حالة زيادة تنوع المشروع :

العائد والتكلفة

من الأسفل الى الأعلى

المخصصات

من الاعلى الى الاسفل

١٠٠- تفضل الاساليب ..... عند عملية الاختيار لأنها اكثر دقة وموضوعية واكل تحيز شخصى :

الحكمية

الكمية

النوعية

الوصفية

١٠١- من الاساليب الكمية التى تتجاهل مفهوم القيمة الزمنية للنقود عند اختيار المشاريع :

فترة الاسترداد مع سعر الخصم

فترة الاسترداد

مؤشر الربح

صافى القيمة الحالية

١٠٢- تغطي موازنة المشروع ..... المشروع :

خطة

حياة

سنة واحدة

جدولة

١٠٣- تشهد مرحلة اعداد الخطة ..... للمشروع قيام الجهة الاعلى بتدقيق الخطة الابتدائية وتقوم بإضافة الأنشطة والجدول

والموازنات عليها ثم رفعها للجهة الاعلى منها وهكذا التدقيق والمراجعة :

التفصيلية

المركبة

الابتدائية

النهائية

١٠٤- المشاريع هى منظمات مؤقتة تختلف عن المنظمات الوظيفية فى الآتى ما عدا :

- نتائج الصراع  
طبيعة الصراع  
عمق الصراع  
الاهداف
- ١٠٥- الذى يقود المشروع والمسؤول عن نجاحه وفشله هو .....
- مدير المشروع  
فريق المشروع  
المدير الوظيفى  
مدير المنظمة
- ١٠٦- احتمال الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد لتنفيذ المشروع يساوى :
- ٥٠% ٧٠%  
٨٠% ١٠٠%  
( ما هو احتمال الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد لتنفيذ المشروع . (٥٠%) ) →
- ١٠٧- تتضمن البرمجة الشبكية الاساليب التالية :
- المسار الحرج  
العظمة والسمة  
خرائط جانث  
خرائط باريتو
- ١٠٨- تتضمن ايجابيات المشروع المستقل الآتى :
- وحدة الامر  
التركيز على العميل  
التجانس الثقافى  
المرونة العالية
- ١٠٩- طريقة لاختيار المشاريع يقوم من خلالها شخص مهم وذو سلطة باصدار اوامره بتنفيذ مشروع ما دون اى معايير جدوى :
- البقرة المقدسة  
الضرورة التشغيلية  
الضرورة التنافسية  
ديلفى
- ١١٠- ينتج عن التعارض بين سعى الاطراف فى المنظمة لتحقيق مصالحها ما يسمى بـ .....
- الصراع التنظيمى  
الالتزام التنظيمى  
الرضا الوظيفى  
الولاء التنظيمى
- ١١١- يعتبر إعداد موازنة المشروع الخطوة الأولى والأساسية لعملية الرقابة على .....
- التكلفة  
المخزون  
العائد  
الجودة
- ١١٢- تعرف ..... المشروع بانها تسعير خطة المشروع
- موازنة  
تجزئة  
جدولة  
خطة
- ١١٣- تمتاز بيئة الاعمال المعاصرة بـ .....
- الديناميكية  
الثبات  
البساطة  
الغنى
- ١١٤- يشمل التنظيم ..... خليط من التنظيم الوظيفى والتنظيم المستقل بحيث يتم الاستفادة من مميزاتهما جميعا والتخلص من عيوبهما :
- المصنوفى  
الاستشارى  
المستقل  
الوظيفى

١١٥- هناك حاجة الى اشكال تنظيمية ..... تمكن المشاريع من النجاح للوصول لأهدافها في بيئة الاعمال المعاصرة :

مبتكرة تقليدية

رسمية غير رسمية

١١٦- يعرض ..... للأسلوب الادارى والفنى لخطه المشرع

المنهج العام اهداف المشروع

الاجوه التعاقدية العرض العام

١١٧- من اسباب تمويل المنظمات المشاريع غير المربحة الآتى ما عدا :

معرفة او تكنولوجيا قديمة تحسين المركز التنافسى

توسيع خط الانتاج المسؤولية الاجتماعية

١١٨- تدار المنظمات بـ .....

التعاون الصراع

المشكلات المخاطر

١١٩- يعتمد اعدا الخطة ..... على مفهوم تجزئة هيكل العمل وتحليل العمل هرميا من الاعلى الى الاسفل :

الابتدائية المركبة

التفصيلية النهائية

١٢٠- يحتاج المشروع الى مجموعة من الانشطة المتتابعة :

الاعتمادية التفرد

الصراع الغاية

١٢١- تشمل خصائص مدير المشروع الآتى ما عدا :

الهروب من مواجهة التحديات الحصول على الموارد اللازمة للمشروع

اختيار فريق المشروع التفاوض

١٢٢- من انواع تنظيم المصفوفة الآتى ما عدا :

مصفوفة العائد والتكلفة المصفوفة الوظيفية

مصفوفة المشروع المصفوفة المتوازنة

١٢٣- تعتمد طريقة بيرت على ..... زمن/ ازمة لحساب وتقدير زمن النشاط :

ثلاثة اربعة

خمسة سنة

١٢٤- تسريع وقت تنفيذ المشروع يعنى ..... وقت المسار الحرج

تقصير تطويل

تحديث تكرار

.....
